



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
ЦАРИНСКА УПРАВА

**НАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТЕН ПЛАН
ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЗАЕДНИЧКИОТ ТРАНЗИТЕН СИСТЕМ NCTS
(НОВИОТ КОМПЈУТЕРИЗИРАН ТРАНЗИТЕН СИСТЕМ) ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Ноември 2010 година



I. Планирање

Реф.	Цели NCTS фаза-4	Почеток	Крај	Траење во денови
	Име на националната администрација - Царинска управа на Република Македонија Дата на издавање 14.05.2010			
	НАЦИОНАЛНИ ЦЕЛИ			
1	Комплетирани NTA спецификации	01.11.2010	09.02.2011	100
2	Комплетиран развојот на NTA	10.02.2011	10.08.2011	180
3	Успешно завршено тестирање по mode 1	11.08.2011	10.10.2011	60
4	Апдејтирање на CCN околината	11.06.2011	16.06.2011	5
5	Апдејтирање на CS/RD референтните податоци	11.06.2011	16.06.2011	5
6	Целосно подготвен национален domeин	03.11.2010	24.06.2012	540
7	Целосно подготвен надворешен domeин	03.11.2010	24.06.2012	540
8	Функционален национален Help Desk	03.11.2010	24.06.2012	540
	МЕЃУНАРОДНИ ЦЕЛИ			
9	Утврден датум за влез во ECG (NCTS)	15.07.2011	15.07.2011	1
10	Демонстрирано успешно тестирање по mode 1	11.10.2011	11.10.2011	1
11	Успешно комплетирано тестирање пред прифаќање	12.10.2011	11.12.2011	60
12	Успешно комплетирано тестирање за фактичко прифаќање	12.12.2011	11.02.2012	60
13	Завршена обука на корисниците на NCTS и персоналот за поддршка (и поврзување на трговците)	12.02.2012	11.05.2012	90
14	Успешно комплетирано меѓународно (mode 3) тестирање	10.03.2012	15.03.2012	5
15	Презентација на ECG на националниот проект пред започнување со активностите	15.05.2012	15.05.2012	1
16	Добивање на одобрувачка одлука на операциите од фаза 4.0	08.06.2012	08.06.2012	1
17	Завршен финалниот менаџмент за влез	08.06.2012	20.06.2012	12
18	Финални подготовки за операциите од фаза-4 за NCTS	21.06.2012	24.06.2012	4
	НАДВОРЕШНИ ЦЕЛИ			
19	Датум на оспособеност на NCTS фаза-4 усогласени спецификации за поврзаност на трговците	10.02.2012	24.06.2012	135
20	Датум на оспособеност на NCTS фаза-4 усогласена тестираната поставеност за поврзаност на трговците	10.03.2012	24.06.2012	106
21	Датум на оспособеност на NCTS фаза-4 усогласена трговска поврзаност	21.06.2012	24.06.2012	4



1. NCTS фаза 4 Национални цели за сите царински управи

NCTS-P4-NM-1 Комплетирани NTA спецификации

Опис:	Секоја национална управа треба да ги комплетира своите NTA спецификации што е можно порано	Одговорни во Царинската управа:
Главни задачи:	<ol style="list-style-type: none">1. Идентификација на националните NTA потреби.2. Спецификација на национален NTA дизајн сите поврзаности со неговиот надворешен domein, централниот сервис и со додатни национални царински апликации (ако постојат)3. Спецификација на информациска и комуникациска технологија за корисниците на националниот и надворешниот domein	<ol style="list-style-type: none">1. Бизнес одделение2. IT одделение / изведувач на проектот (NCTS IT поддршка)3. IT одделение / изведувач на проектот (NCTS IT поддршка)
Производ:	Достапни национални NTA спецификации	
Почеток:: 01.11.2010	Крај: 09.02.2011	Траење: 100 дена

NCTS-P4-NM-2 Комплетиран развојот на NTA

Опис:	Секоја царинска управа треба да го комплетира развојот на нејзината NTA пред да ја исполни оваа цел	Одговорни во Царинската управа на
Главни задачи::	<ol style="list-style-type: none">1. Развој на NTA;2. Развивање и интегрирање на додатни поврзувања и апликации на националниот и надворешниот domein;3. Тестирање на единиците	<ol style="list-style-type: none">1. Изведувач на проектот (NCTS IT поддршка)2. Бизнес одделение / IT одделение / изведувач на проектот (NCTS IT поддршка)
Производ:	NTA е развиен и интегриран	
Почеток: 10.02.2011	Крај: 10.08.2011	Траење: 180



NCTS-P4-NM-3 Успешно завршување на тестирањето на mode 1

Опис:	Секоја царинска управа треба да ја тестира својата фаза 4 NTA на национално ниво, одвоено, употребувајќи локална алатка за тестирање (STTA) преку размена на информации со заедничкиот домен. Оваа процедура обезбедува дека апликацијата е подготвена за усогласувачко тестирање со ITSM.	Одговорни во Царинската управа
Главни задачи:	<ol style="list-style-type: none">1. Идентификација на националните потреби за тестирање2. Да се осигура дека сите сценарија во Протоколот за тестот за усогласување (СТР) се вклучени во националните тестирачки услови3. Изведба на тестирање додека тестирањето не е успешно завршено	<ol style="list-style-type: none">1. Бизнис одделение / IT одделение2. Изведувач на проект (NCTS IT поддршка) / изведувач на проект (менаџерска поддршка)3. Бизнис одделение / IT одделение/ изведувач на проект (NCTS IT поддршка) / изведувач (менаџерска поддршка)
Производ:	Успешно извршување на тестирањето	
Почеток:	11.08.2011	Крај: 10.10.2011
		Траење: 60 дена

NCTS-P4-NM-4 CCN постава

Опис:	Царинската управа треба да имплементира CCN/CSI Gateway и модулот на CDPS за конекција со CCN/CSI мрежата за NCTS пораките.	Одговорни во Царинската управа
Главни задачи:	<ol style="list-style-type: none">1. Тендер за избор на изведувач/развијач на CCN/CSI2. Имплементација на CCN/CSI Gateway3. Дизајнирање и развивање на CDPS модул за поврзување на NCTS менаџмент пораките со комуникациската платформа CCN/CSI	<ol style="list-style-type: none">1. IT одделение2. Изведувач на проект (CCN/CSI)3. Изведувач на проект (NCTS IT Support)
Производ:	CCN/CSI Gateways и апликации	



подготвени за NCTS фаза-4

Почеток: 11.06.2011 Крај: 16.06.2011

Траење: 5

NCTS-P4-NM-5 Апдејтување на CS/RD референтни податоци

Опис: Секоја царинска управа треба да ги апдејтува CS/RD референтните податоци Одговорни во Царинската управа

Главни задачи:

1. Апдејтување на царинската канцелариска листа
2. Апдејтување на заедничките референтни податоци

1. Бизнис одделение
2. Бизнис одделение

Производ: Апдејтувани CS/RD референтни податоци

Почеток: 11.06.2011 Крај: 16.06.2011

Траење: 5

NCTS-P4-NM-6 Целосно подготвен национален domeин (ND)

Опис: Секоја царинска управа мора да се осигура дека нивните национални domeин точки се целосно подготвени за NCTS фаза 4 Одговорни во Царинската управа

Главни задачи:

1. Идентификација на додатни услови за IT хардвер, софтвер, телекомуникации и алатки на корисниците во националниот domeин.
2. Набавка и инсталирање по потреба
3. Организирање на end-to-end верификација на линкот на националниот domeин
4. Организирање на информативни предавања и обуки за националниот domeин

1. IT одделение / Изведувач на проектот (NCTS IT поддршка)
2. IT одделение / Изведувач на проектот (NCTS IT поддршка)
3. Бизнис одделение / IT одделение
4. Бизнис одделение / IT одделение

Производ: Националниот domeин е целосно подготвен за NCTS фаза 4

Почеток: 03.11.2010 Крај: 24.06.2010

Траење: 540

NCTS-P4-NM-7 Целосно подготвен надворешен domeин (ED)

Опис: Секој царинска управа треба да утврди дека нејзиниот надворешен domeин е подготвен за фаза-4 Одговорни во Царинската управа



Главни задачи:	<ol style="list-style-type: none">1. Идентификација на додатни национални барања на надворешниот domein2. Специфицирање на додатни поврзувања на надворешниот domein по потреба3. Организирање на верификација од почеток до крај на линкот на надворешниот domein4. Тестирање на усогласеноста на пораките од надворешниот domein5. Организирање на обука и информации за надворешниот domein	<ol style="list-style-type: none">1. Бизнис одделение2. ИТ одделение / изведувач на проект (NCTS IT Support)3. Бизнис одделение / ИТ одделение4. Бизнис одделение / ИТ одделение/ изведувач на проект (NCTS IT поддршка)5. Бизнис одделение / ИТ одделение
Производ:	Надворешниот domein е целосно подготвен за NCTS фаза-4	
Почеток: 03.11.2010	Крај: 24.06.2010	Траење: 540

NCTS-P4-NM-8 Функционален национален Help Desk

Опис:	Царинската управа ќе подготви национален NCTS Help Desk за царинските работници, трговци и други царински управи	Одговорни во Царинската управа
Главни задачи:	<ol style="list-style-type: none">1. Амандмани на документите за организација и систематизација на Царинската управа2. Обука на персоналот3. Воспоставување на комуникација4. Подигање на свеста за работата на Helpdesk-от во CARM и трговската заедница	<ol style="list-style-type: none">1. Бизнис одделение2. Бизнис одделение / ИТ одделение3. ИТ одделение4. Бизнис одделение / ИТ одделение
Производ:	Достапен NCTS Help Desk за сите царински работници, трговци и други царински управи	
Почеток: 03.11.2010	Крај: 24.06.2012	Траење: 540



2. NCTS фаза 4 Меѓународни цели за сите царински управи

NCTS-P4-IM-1 Дата утврдена за влез во Електронската царинска група-ECG (NCTS)

Опис:	Секоја царинска управа ќе утврди датум за почеток на фазата-4 Царинските управи треба да ја исполнат оваа цел не помалку од 6 месеци пред нивниот планиран влез во фазата-4	Одговорни во Царинската управа
Главни задачи:	<ol style="list-style-type: none">1. Пред оваа обврска, царинските управи мораат да обезбедат СРТ со апдејтувани или потврдени информации за планирањето на квартална основа2. Заради оваа обврска, царинските управи мораат да обезбедат СРТ со апдејтувани или потврдени информации за планирањето барем еднаш месечно	<ol style="list-style-type: none">1. Бизнис одделение2. Бизнис одделение
Производ:	Утврден почетен датум за фаза-4 објавена од царинските управи и регистрирана од Електронската царинска група-ECG	
Почеток: 15.07.2011	Крај: 15.07.2011	Траење: 1

NCTS-P4-IM-2 Демонстрирано успешно тестирање на модул 1

Опис:	Употребувајќи ја СТТА како тест алатка, царинската управа ќе демонстрира успешно Mode 1 тестирање на фаза-4 NTA со испраќање на централниот проект тим информациите од тестирањето што ќе ги покрие барем тестовите од Протоколот за тест на усогласеноста. Пред оваа цел, треба да се исполни горе наведената NCTS-P4-NM-3	Одговорни во Царинската управа
Главни задачи:	Изведување на сите сценарија од Протоколот за тестирање на усогласеноста (СТР) дефинирани за посебни фази, тестирање на NTA во однос на STTA	Бизнис одделение / IT одделение / Изведувач на проект (NCTS IT поддршка) / Изведувач на проект (менаџерска поддршка)



Производ: Демонстрирано успешно тестирање (mode 1) на фаза 4 NTA со испраќање STTA информации за анализа до Централниот проектен тим и подобрување на NTA ако е потребно

Почеток: 11.10.2011 Крај: 11.10.2011

Траење: 1

NCTS-P4-IM-3 Комплетирано пред-усогласувачко тестирање

Опис: Неформалното пред-усогласувачко тестирање и овозможува на царинската управа да изгради доволно доверба во нивното NTA и да ја тестира специфичната функционалност на фазата 4. Пред оваа цел, потребно е да се исполнат горенаведените NCTS-P4-NM-3 и NCTS-P4-IM-2

Главни задачи:

1. Царинските управи треба да ги остварат следниве задачи пред да ги започнат активностите за пред-усогласувачко тестирање:
 - Поставување на неопходната тест-поставка за поддршка на NTA;
 - Составување на тимот главен за спроведување на тестовите;
 - Планирање на активностите;
 - Успешно комплетирање на тестот на TTA за поврзаност;
 2. Сите сценарија за СТР поврзани со NCTS фаза 4 ќе бидат изведени тестирање на NTA спрема TTA со подвижна конзола.
1. Бизнис одделение / IT одделение / изведувач на проект (NCTS IT поддршка) / изведувач на проект (менаџерска поддршка)
 2. Бизнис одделение / IT одделение / изведувач на проект (NCTS IT поддршка) / изведувач на проект (менаџерска поддршка)

Производ: Фино подесена фаза 4 NTA, подготвена за тестирање за усогласеност

Почеток: 12.10.2011 Крај: 11.12.2011

Траење: 60



NCTS-P4-IM-4 Успешно комплетирано фактичкото тестирање на усогласеност

Опис:	Испланиран завршен датум на конкретните усогласувачки тестови. Напредокот ќе биде следен од централниот проектен тим за осигурување на квалитет изведувач на проектот и ITSM Пред оваа цел, треба да се исполни горенаведениот NCTS-P4-IM-3	Одговорни во Царинската управа
Главни задачи:	Успешно извршени сите тесови на СТР, тестирање на NTA во однос на ТТА	Бизнис одделение/ИТ одделение/ изведувач на проект (NCTS IT поддршка) /изведувач на проект (менаџерска поддршка.)
Производ:	Успешен извештај за тестирање на усогласеноста и ТТА информации	

Почеток: 12.12.2011	Крај: 11.02.2012	Траење: 60
---------------------	------------------	------------

NCTS-P4-IM-5 Комплетирана обуката на персоналот за поддршка и корисниците на NCTS (и трговска поврзаност)

Опис	Обуката на сите корисници на NCTS и персоналот за поддршка (и трговската поврзаност) мора да е комплетирана пред почетокот на фаза 4	Одговорни во Царинската управа
Главни задачи:	<ol style="list-style-type: none">1. Развивање и обезбедување на кориснички упатства и информации поврзани со операциите и функционалноста на фаза 42. Обезбедување на соодветна обука за корисниците на NCTS и персоналот за поддршка, вклучувајќи ги царинските работници и систем администратори (како и ако е можно, претставници на трговците) поврзана со функционалноста на фаза 4 од NCTS	<ol style="list-style-type: none">1. Изведувач на проектот (NCTS IT поддршка) / изведувач (менаџерска поддршка)2. Изведувач на проектот (NCTS IT поддршка)
Производ	Обучени корисници на NCTS и	



Национален проектен план за имплементација на заедничкиот транзитен систем NCTS во Република Македонија

персоналот за поддршка

Почеток: 12.02.2012 Крај: 11.05.2012

Траење: 90

NCTS-P4-IM-6 Успешно комплетирано меѓународно (Mode-3) тестирање

Опис: Тестирање на NTA со размена на пораки со една или повеќе царински управи (во функционална конфигурација).
Во овој случај не се употребува посебна тест алатка (STTA или TTA) туку се разменуваат група од вистински тест пораки.
Единствената вклученост на СРТ е да ги координира активностите помеѓу две или повеќе држави и да им помогне во анализата и дијагнозата на известните проблеми.
Пред да се исполни оваа цел, потребно е да се исполни горенаведениот NCTS-IM-4

Главни задачи:

1. Царинските управи што успешно го поминале тестирањето на усогласеност мора да спроведат меѓународен тест со барем една одбрана функционална царина на нивна оперативна постава.
2. Овој интернационален тест идеално би се спровел со две функционални царински управи (една CDTA и една NDTA). Овој меѓународен тест мора да е успешно поминат една работна недела пред планираниот датум за започнување на активностите.

1. Бизнис одделение / IT одделение
2. Бизнис одделение / IT одделение

Производ: Тестовите се изведени успешно

Почеток: 10.03.2012 Крај: 15.03.2012

Траење: 5

NCTS-P4-IM-7 Презентација на националниот проект на Електронската царинска група (ECG) пред почетните активности

Опис: Презентација на националниот проект на Електронската царинска група (ECG) пред почетните активности

Одговорни во Царинската управа



Главни задачи: Демонстрирање на подготвеност за почетните активности 1. Бизнис одделение / IT одделение

Производ:

Почеток: 15.05.2012 Крај: 15.05.2012 Траење: 1

NCTS-P4-IM-8 Добивање на одобрувачка одлука за активностите во фаза-4

Опис: Добивање на одобрувачка одлука за активностите во фаза-4 Одговорни во Царинската управа

Главни задачи: Добивање на одобрувачка одлука за почетните активности 1. Електронската царинска група (ECG) и национален Проект менаџер

Производ: Потврден почетниот датум за NCTS во Македонија

Почеток: 08.06.2012 Крај: 08.06.2012 Траење: 1

NCTS-P4-IM-9 Завршен финалниот менаџмент за влез

Опис: Кога царинските управи ќе добијат потврда од Електронската царинска група (ECG) за планираниот датум за почетокот на фаза 4, ќе изготват листа за да се осигура дека сите компоненти на NCTS проектот се подготвени за фазата која сакаат да ја започнат. Пред оваа цел, треба да се исплни гореспоменатиот NCTS-P4-IM-4. На крајот на фактичкиот тест за усогласеност, на конференциски состанок со царинските управи и СРТ, СРТ (бизнис мониторингот) ќе ги посочи останатите отворени прашања во врска со "старатната листа на активности"

Главни задачи: 1. Апдејтување на уписот за CS/MIS mailing list-от за уписи за фаза 4 2. Апдејтување на достапноста на NTA ако има потреба 3. Разгледување на информациите за напредок со СРТ со други царински управи што се 1. Бизнис одделение 2. Бизнис одделение 3. Бизнис одделение



Национален проектен план за имплементација на заедничкиот транзитен систем NCTS во Република Македонија

функционални или истовремено
се приклучуваат

Производ: Заедничка потврда за почеток од
царинските управи и СРТ

Почеток: 08.06.2012 Крај: 20.06.2012

Траење: 12

NCTS-P4-IM-10 Завршни припреми за активностите на фаза 4 за NCTS

Опис: Функционален почеток на NCTS фаза 4 Одговорни во Царинската управа
Царинските управи се советуваат да ги планираат последните подготовки за активностите за фаза-4. Пред оваа цел, треба да се исполнат гореспоменатите NCTS-P4-IM-6 и NCTS-P4-IM-7

Главни задачи:

1. Изведување на end-to-end верификација на линкот на заедничкиот domeин CCN/CSI со функционалните постави на други царински управи кои се функционални или истовремено се приклучуваат
2. Синхронизација на почетокот на активностите од фаза-4 со централниот тим на проектот и со царинските управи што се функционални и што се приклучуваат истовремено.
3. Формално да се извести ECG за започнување на активностите од фаза-4 на национално ниво

1. Бизнес одделение / ИТ Одделение Изведувач на проектот (NCTS ИТ поддршка)
2. Бизнес одделение / ИТ Одделение Изведувач на проектот (NCTS ИТ поддршка)
3. Бизнес одделение

Производ: Активности за NCTS во фаза-4

Почеток: 21.06.2012 Крај: 24.06.2012

Траење: 4

3. NCTS Фаза 4 Надворешни цели за сите царински управи

NCTS-P4-EM-1 Датум на достапност на NCTS фаза-4 усогласени спецификации за EDI трговската поврзаност

Опис: Пред трговците (Економските оператори) да можат да ја развијат/апдејтуваат поврзаноста помеѓу нивните трговски системи и Одговорни во Царинската управа



националната транзитна апликација, царинските управи мораат да ги обезбедат спецификациите на поврзаноста. Пред оваа цел, мора да се исполни гореспоменатата NCTS-P4-NM1

Главни задачи:	<ol style="list-style-type: none">1. Развивање на EDI (External Domain interface) спецификациите во рамки на NCTS-P4-NM12. Да се направат EDI (External Domain interface) спецификациите достапни за трговците3. Објавување на достапноста на EDI (External Domain interface) спецификациите	<ol style="list-style-type: none">1. Изведувач на проектот (NCTS IT поддршка)2. Изведувач на проектот (NCTS IT Поддршка)3. Бизнес одделение / IT Одделение
----------------	--	--

Производ: Достапни спецификации за EDI (External Domain Trader interface)

Почеток: 10.02.2012 Крај: 24.06.2012 Траење: 135

NCTS-P4-EM-2 Датум на достапност на NCTS фаза-4 усогласена тест поставеност за трговска поврзаност

Опис:	Царинската управа спрема тест инсталација за да изврши тестирање на апликацијата за сите трговци Пред оваа цел, треба да се исполни горенаведениот NCTS-P4-NM6	Одговорни во Царинската управа
-------	---	--------------------------------

Главни задачи:	<ol style="list-style-type: none">1. Развој и тестирање на поврзаноста на надворешниот domein во рамките на NCTS-P4-NM6 и NCTS-P4-NM7	<ol style="list-style-type: none">1. Изведувач на проектот / Бизнес одделение / IT Одделение
----------------	---	--

Производ: Сите трговци во рамките на царинската управа можат да ја тестираат нивната апликација

Почеток: 10.03.2012 Крај: 24.06.2012 Траење: 106



NCTS-P4-EM-3 Датум на достапност на NCTS фаза-4 усогласена трговска поврзаност

Опис:	Царинската управа мора да ја воспостави трговската поврзаност од нивната национална транзит апликација достапна за употреба за трговците (економските оператори). При крајот кон исполнувањето на оваа цел, може да се очекува значителна зголеменост на пораките на заедничкиот domein. Пред оваа цел, треба да се исполнат гореспоменатите NCTS-P4-NM6 и NCTS-P4-NM7	Одговорни во Царинската управа
Главни задачи:	<ol style="list-style-type: none">1. Развој и тестирање на надворешниот domein во рамките на NCTS-P4-NM6 и NCTS-P4-NM72. Поврзаноста со надворешниот domein да стане достапен до трговците3. Објавување на достапноста на надворешниот domein	<ol style="list-style-type: none">1. Спроведувач на проектот / Бизнис одделение / ИТ Одделение2. Спроведувач на проектот / Бизнис одделение / ИТ Одделение3. Спроведувач на проектот / Бизнис одделение / ИТ Одделение
Производ:	Достапен надворешен domein на трговска поврзаност	
Почеток: 21.06.2012	Крај: 24.06.2012	Траење: 4


II. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ

III. Структура на проектот за NCTS

Следната структура на проектот ќе биде усвоена за NCTS.

Дијаграм

1.1.3.1.1

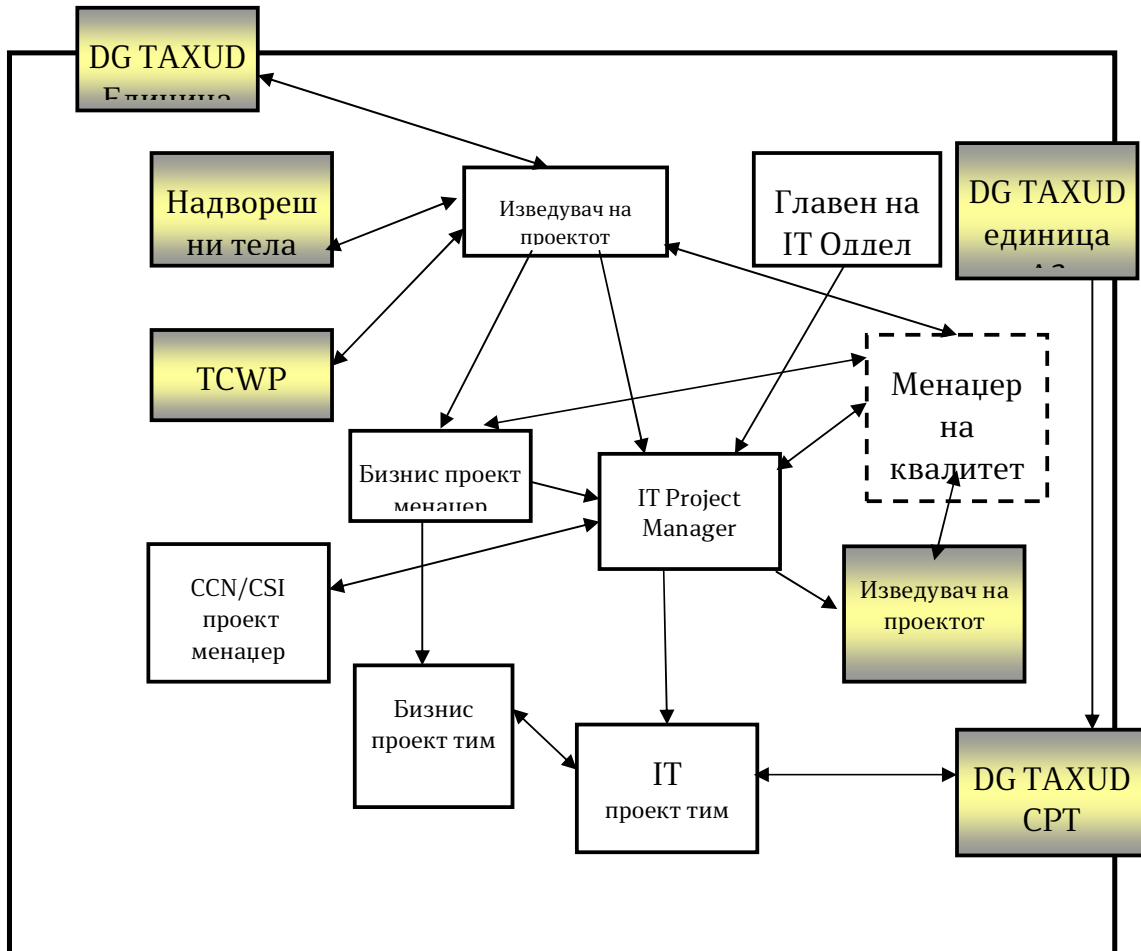



Забелешка

Креирањето и развојот на CDPS модул за поврзаност и менаџирање на NCTS пораките со комуникациската платформа CCN/CSI (Заедничка комуникациска мрежа/ Општ систем на поврзаност) и поврзувања со другите системи што се важни за NCTS – фаза 4, или подоцнежна фаза, е дел од договорот за NCTS софтверско развивање.

Добра комуникација со CCN/CSI проект менаџерите е неопходна.


Структура на проектот за CCN/CSI

The CCN/CSI е изготвен (освен конфигурациите) чисто технички систем, и затоа за овој проект најверојатно нема да има потреба од многу средства.

Досегашните искуства покажуваат дека CCN/CSI може да се инсталира, тестира и да функционира за 6 месеци (под претпоставка дека договорите за финансирање се потпишани).

Ќе биде назначен CCN/CSI Проект менаџер и ќе му се додели целосната одговорност, во блиска поврзаност со царината и PRO IT одделенијата, Проект менаџерите (конфигурација на gateway, CSI програмирање, ...) и DG TAXUD експертите за инсталација на CCN/CSI gateway (Единица A3 и CCN/TC).

Дијаграм

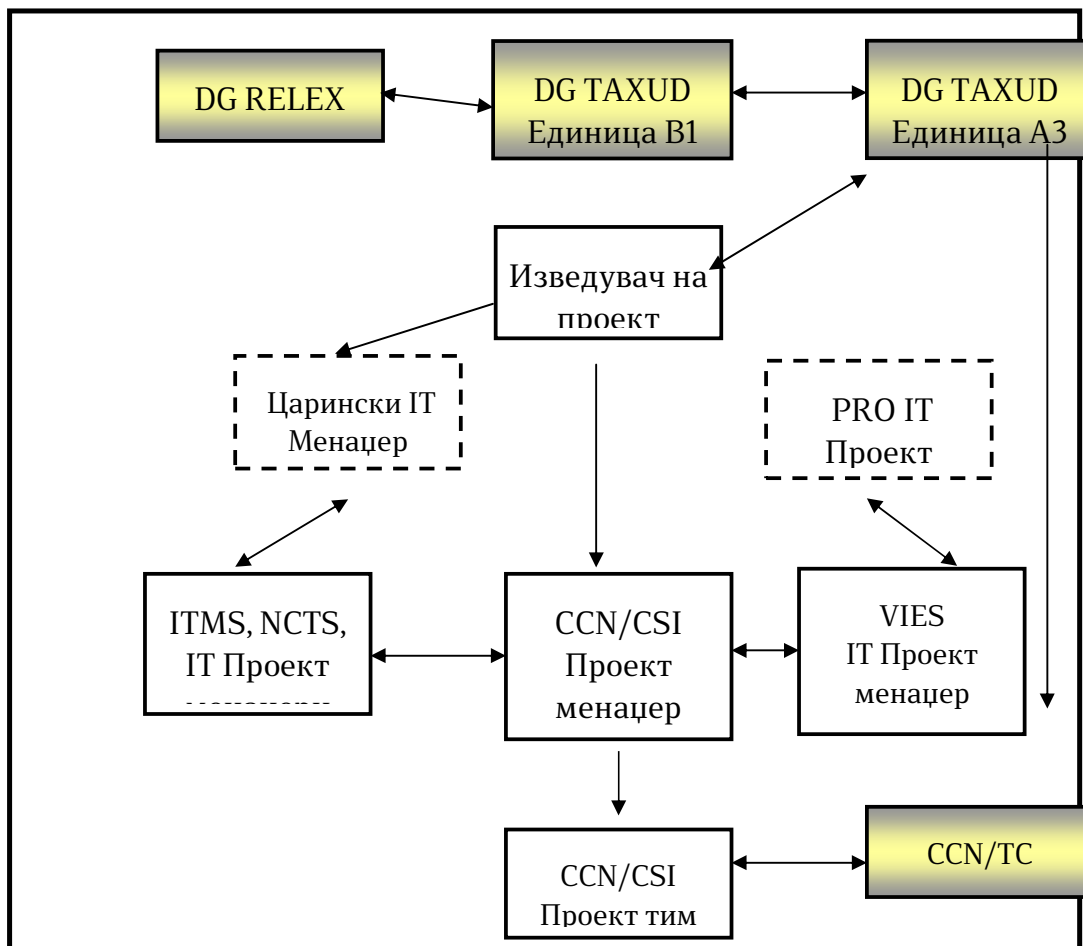



Врз основа на делот 3 „ORGANIZATION” од "Interoperability Implementation Strategy – IIS” NCTS Националниот Проект менаџер треба да изготви NCTS организација на проектот.

IV. РИЗИЦИ/ПРЕДИЗВИЦИ

Бр.	Ризик/Предизвик	Одговорен	Забелешки
1	Националната транзитна компонента од CDPS да не е имплементирана и функционална	Царинска управа ,CDPS Проект менаџер	Последните планови за CDPS предвидуваат дека соодветните компоненти од NCTS ќе бидат достапни кон крајот на Јули 2010
2	Константниот тим на NCTS не е составен и одржлив пред почетокот на договорот, вклучувајќи минимум 4 бизнисмени и 2 информатичари.	Изведувач на проектот NCTS	Тимот е веќе делумно утврден
3	Недостаток на достапна CCN/CSI поврзаност	Изведувач на проектот CCN/CSI	Почетните набавки и имплементација зависи од поддршка од DG TAXUD.
4	Недостаток на достапна хардвер и софтвер платформа во Царинската управа за подсистемот NCTS	Царинска управа IT Менаџер	
5	Недоволно познавање на NCTS апликацијата од страна на изведувачот на проектот	Изведувач на проектот NCTS поддржан од Менаџерот за квалитет од IPA NCTS Проектот за менаџерска поддршка.	Овој ризик би требало да е намален со цврсти услови поставени во TOR и објавувањето на тендерот.
6	Недоволно достапна документација за националната транзитна апликација	Царинска управа на РМ, CDPS Проект менаџер	Последните планови за CDPS предвидуваат дека соодветните компоненти од NCTS и документација ќе биде достапна до крајот на јули 2010
7	Недостаток на посветеност или	Изведувач на	Во TOR на проектот се



	несоодветна распоредување на ресурсите од страна на спроведувачот на проектот	проектот NCTS	вклучени минимум потребните средства
8	Недоволна осигураност за квалитетот на стратегискиот план и главните компоненти на проектот	Изведувач на проектот NCTS поддржан од Менаџерот за квалитет од IPA NCTS Проектот за менаџерска поддршка.	Овој ризик треба да е намален со изработувањето на добар проектен план за квалитет во почетната фаза.
9	Несоодветна координација и менаџирање на проектот од страна на Царинската управа	Изведувач на проектот NCTS поддржан од Менаџерот за квалитет од IPA NCTS Проектот за менаџерска поддршка.	Тимот е веќе делумно утврден

V. ЗАДАЧИ

Табела на задачи за следните 9 месеци

Бр.	Задача	Предвидена завршна дата	Одговорен за задачата	Забелешки
1	CDPS/NCTS обезбедени и одобрени соодветните компоненти	31.7.2010	Проект менаџер на CDPS од Царинската Управа	
2	Добиена согласност за стратегија за условите за договор за CCN/CSI	31.5.2010	Изведувач на проектот CCN/CSI	
3	Изготвени тендерски документи за CCN/CSI	31.10.2010	Изведувач на проектот CCN/CSI	
4	Доделен договор за софтверско развивање на NCTS	31.10.2010	Изведувач на проектот NCTS	
5	Доделен договор за менаџерска поддршка на NCTS	31.10.2010	Изведувач на проектот NCTS	
